



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT

IZVJEŠTAJ O NAPRETKU

Mjera: 04
Podmjera: 4.3.
Operacija: 4.3.1.

NAZIV KORISNIKA	<u>Brodsko posavska županija</u>
ADRESA	<u>Petra Krešimira IV. 1, Slavonski Brod</u>
DATUM ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA	<u>2. svibnja 2017.</u>
NAZIV ULAGANJA (iz Odluke)	<u>Gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (SN Orubica)</u>
KRAJNI ROK ZA DOSTAVU	
ZAHTJEVA ZA ISPLATU (iz Odluke/Aneksa)	<u>11. svibnja 2020.</u>

Provedene aktivnosti:

Od zadnjeg 4. Izvještaja o napretku od 07.05.2019., provedene su u bitnom slijedeće aktivnosti na provedbi projekta, odnosno ulaganja:

- Sukladno Planu nabave Korisnika potpore u 2019. godini, za projekt je predviđena provedba jedne jednostavne nabave. Postupak nabave provode Hrvatske vode kao Komisionar Korisnika potpore, a ista se provodi prema internom Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Hrvatskih voda. Predmetna nabava u 2019. godini se odnosi na izradu hidrogeološkog elaborata koji bi trebao dati podatke o broju i točnoj lokaciji piezometara koji se moraju ugraditi na granici sustava navodnjavanja s III. zonom sanitarne zaštite vodocrpilišta Davor prije početka korištenja sustava, za potrebe monitoringa podzemnih voda u tijeku korištenja sustava, sve prema posebnom uvjetu/rješenju nadležnog tijela za zaštitu okoliša. Za navedenu nabavu, donesena je Odluka o imenovanju članova povjerenstva za provedbu predmetne nabave 24.10.2019. te je objavljen javni Poziv za dostavu ponuda na web stranicama Hrvatskih voda www.voda.hr.
- Realizacija potpisanih ugovora u 2018. godini se nastavila te je u tablici u Prilogu 1. ovog izvještaja dan pregled svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta sukladno tablici troškova i koristi iz zahtjeva za potporu, odnosno iz Obavijesti APPRRR-a od 19.04.2019. kao i njihova realizacija po godinama od 01.01.2014. – 29.10.2019. (Napomena: Za ugovore označene crvenom bojom u tekstu prikazan je samo ukupno prihvatljivi iznos od ukupnog iznosa ugovora, odnosno onaj koji je plaćen izvršiteljima isključivo od strane Korisnika potpore ne i onaj dio troškova ugovora plaćen prije 01.01.2014. ili sufinanciran iz Proračuna RH iza 01.01.2014.).
- Radovi se trenutno uredno izvode na zaštiti građevinske jame ulazne građevine, dovodnog cjevovoda i crpne stanice 1 (CS 1), te na taložnici, retencijskom bazenu i crpnoj stanici 2 (CS2) kao i na tlačnoj distribucijskoj mreži (kompletan cjevovod položen, zasunska i spojna okna izgrađena, a montiranje opreme u oknima je u tijeku) (Slike s gradilišta 1-8. u Prilogu 2. ovog Izvještaja).
- Sklopljen je 1. dodatak Ugovora o javnoj nabavi radova dana 23.07.2019. te je sklopljen 1. dodatak Ugovora o javnoj nabavi usluga stručnog nadzora 28.03.2019. (oba su dostavljena 26.09.2019. u APPRRR u sklopu Zahtjeva za isplatu potpore (1. rata))
- Rok trajanja Ugovora o javnoj nabavi radova na građenju sustava (odgovara roku primopredaje građevine nakon ishođene uporabne dozvole), a kojeg prate i nadzori nad gradnjom, je 23.07.2021. iz



razloga što se radi o građevini gdje su glavni objekti (zahvat i crpne stanice) smješteni neposredno uz veliku rijeku (Sava) te je iz tog razloga bilo potrebno osigurati izvođaču dvije ljetne sezone (kad su najniži vodostaji) za izvođenje radova. Izvođač je započeo radove na najkritičnijim objektima - zahvat, dovodni cjevovod i CS 1 - koji su u inundacijskom prostoru u ovoj ljetnoj sezoni (2019.g) po vlastitoj procjeni te se nadamo da neće biti većih hidroloških neprilika te da će se na vrijeme (vezano za razinu r. Save) izaći s radovima na tim objektima van kote terena. Navedeni rok izvršenja Ugovora se kosi s trenutnim rokom dovršenja kompletnog projekta koji je 11.05.2020. po Ugovoru o financiranju br. 004/2017, te ćemo ovisno o tijeku radova, na vrijeme dostaviti eventualni Zahtjev za produljenjem roka po Ugovoru o financiranju br. 004/2017, sve sukladno Pravilniku o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17 i 111/18) ako za to bude potrebe.

- Glede Ugovora o priključenju na EES, sukladno istom dio (50 %) se isplaćuje ranije pa je Korisnik potpore uplatio taj iznos od 50 % ugovora u 2018. godini. HEP izdaje račun tek po okončanju realizacije Ugovora, pa kompletan trošak po ugovoru mora biti sastavni dio zadnjeg Zahtjeva za isplatu potpore.
- Sukladno članku 22. važećeg Pravilnika o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17 i 111/18), Korisniku potpore je APPRRR u 2019. godini isplatio predujam u iznosu od 13.200.000,00 HRK a na temelju dostavljenog Zahtjeva za isplatu predujma.
- Sukladno važećem Pravilnika o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17 i 111/18), Korisnik potpore je u APPRRR dostavio 26.09.2019. Zahtjev za isplatu potpore (1 rata) u kojem s iznosom od 2.710.659,31 HRK Korisnik pravda dio isplaćenog predujma, a iznos za isplatu 1. rate je 6.027.074,57 HRK.

Planirane aktivnosti:

Planira se sklopiti dodatak Ugovora o javnoj nabavi radova s krajem 2019. godine, a koji će obuhvaćati u bitnom do tog trenutka poznate dodatne stavke troškovnika („vanstroškovnički radovi“) koje su nužne za realizaciju projekta, a koje nisu bile predviđene Troškovnikom iz Dokumentacije o nabavi, odnosno osnovnog Ugovora iz razloga koji će biti detaljno obrazloženi u istom. Paralelno s istim ići će i dodatak Ugovora o javnoj nabavi usluga stručnog nadzora.

Planira se ugovoriti hidrogeološki elaborat po završetku postupka nabave u studenom 2019. godine.

Sljedeći Zahtjev za isplatu potpore (2 rata) planira se predati u ožujku 2020. godine.

Na osnovu izrađenog hidrogeološkog elaborata će se pred kraj gradnje sustava (cca 2020. ili 2021. godina) a prije početka korištenja, sukladno posebnom uvjetu nadležnog tijela, nabaviti i ugraditi piezometri. Ostale nabave za projekt, planirati će se i provoditi tijekom realizacije projekta, odnosno izvođenja radova, ukoliko se za istima ukaže potreba za što u ovom trenutku nemamo, a niti možemo imati saznanja.

Radovi i ostale popratne aktivnosti na realizaciji projekta se planiraju nastaviti prema planu.

Datum: 30.10.2019.

Mjesto: Slavonski Brod

Klasa: 325-01/19-01/31

Urbroj: 2178/1-11-01-19-01

Za Korisnika

dr.sc. Damiel Marušić dr.med.vet.





AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT

Prilog 1. Realizacija projekta 01.01.2014.-29.10.2019.

26.498.257,90
26.023.307,74
18.785.637,10
45.283.895,00
13.200.000



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT

Prilog 2. Fotodokumentacija s gradilišta



Slika 1. Radovi na izvedbi konstrukcije zaštite građevinske jame zahvata, dovodnog cjevovoda i crpne stanice 1



Slika 2. Radovi na izvedbi konstrukcije zaštite građevinske jame zahvata, dovodnog cjevovoda i crpne stanice 1



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT



Slika 3. Taložnica, Retencijski bazen i Crpna stanica 2 (pogled s ceste)



Slika 4. Crpna stanica 2




AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT



Slika 5. Spojno okno na cjevovodu

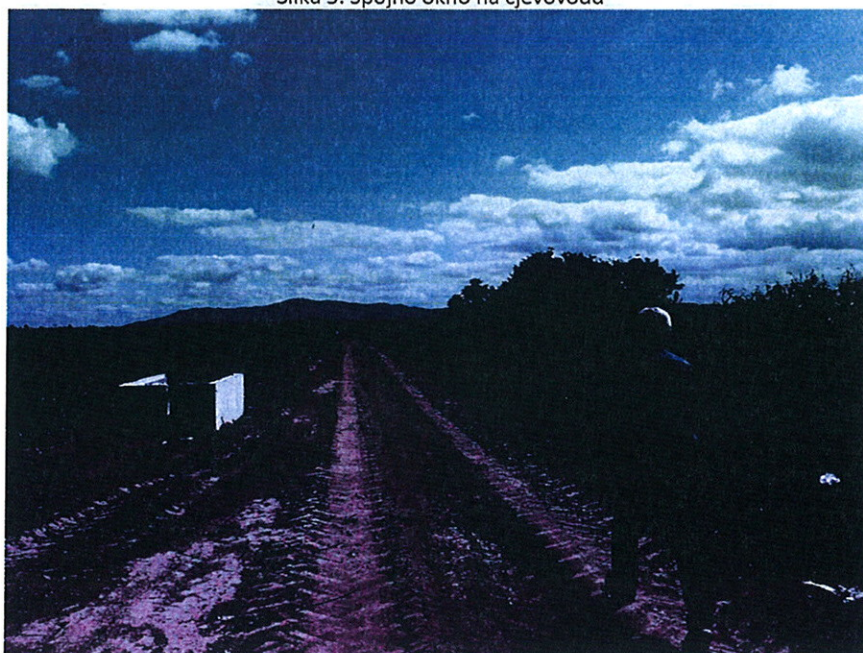


Slika 6. Spojno okna na cjevovodu




AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT

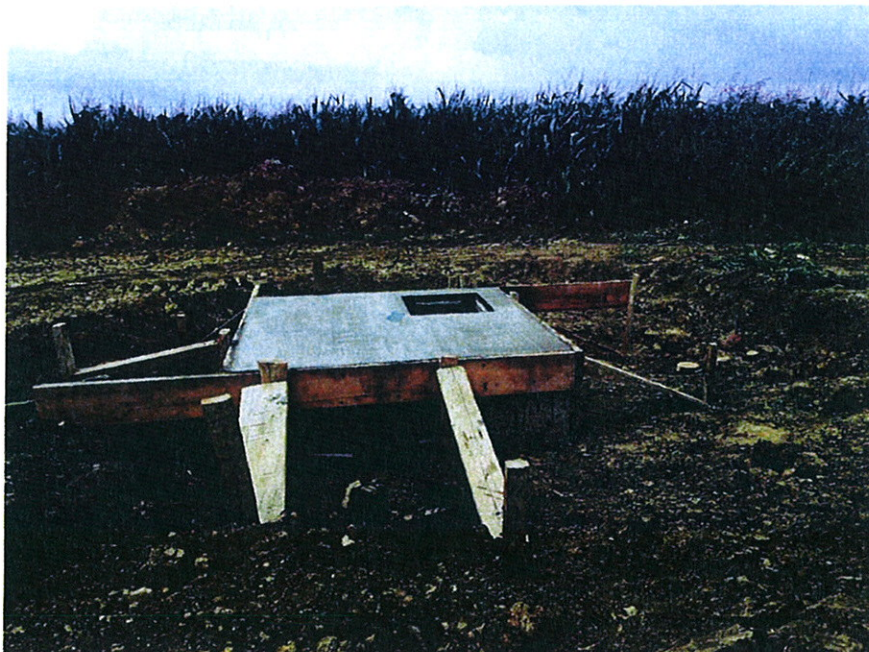

Slika 7. Zasunsko okno na cjevovodu

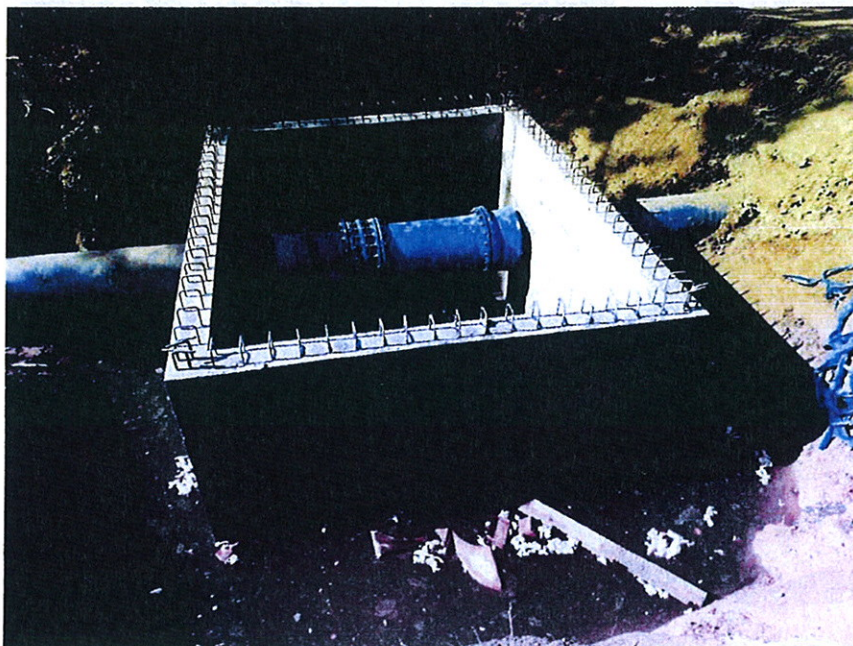

Slika 8. Zasunsko okno na cjevovodu
